



奥粟市新病院整備工事 工事説明会

工事内容

建物概要

- ・敷地面積 39,548.42m²
- ・建築面積 7,215.00m²
- ・延床面積 17,178.11m²
- ・構造 鉄骨造
- ・階数 地上4階
- ・最高高さ (GL+)22.30m

工事概要

- ・工事名称 宍粟市新病院整備工事
- ・計画地 宍粟市山崎町中比地107番地ほか
- ・設計者 株式会社 安井建築設計事務所
- ・施工者 戸田・神名特定建設工事共同企業体
- ・予定工期 2025年7月3日～2027年11月30日

工事に関するお問い合わせ先

■発注者

公立宍粟総合病院 新病院整備室
TEL：0790-62-2410

■施工者

戸田建設株式会社 大阪支店 担当：澤田・京極
TEL：06-6676-8237

※現場事務所電話開設(9月頃)後、仮囲いへ掲示
するとともに、自治会を通じてお知らせ予定

工事の進め方

1.工事の休業日・作業時間

■休業日：土曜日・日曜日・祝日

※ただし、緊急を要する場合(強風・地震等)を除く

■作業時間：午前8時00分～午後6時00分

※ただし、下記のような場合を除く

- 1) 特殊車両搬入・搬出等の所轄警察署や関係監督官庁から指示・指導がある場合
- 2) 振動や騒音を伴わない軽微な作業
- 3) 作業開始前60分及び作業終了後60分程度の準備・片付け作業

2.交通安全対策

■工事用ゲート出入口には交通誘導員を配置し、
周辺歩行者や通行車両の安全確保


3.騒音・振動・粉塵対策

- 低騒音・低振動の工事機械を採用
- 不要な空ぶかしやアイドリングの禁止
- 粉塵発生作業では散水の実施

4.環境対策

- 周辺道路を汚さないよう、タイヤ洗浄の徹底
- 工事エリア周辺美化のため、定期的な清掃活動の実施

工事全体スケジュール

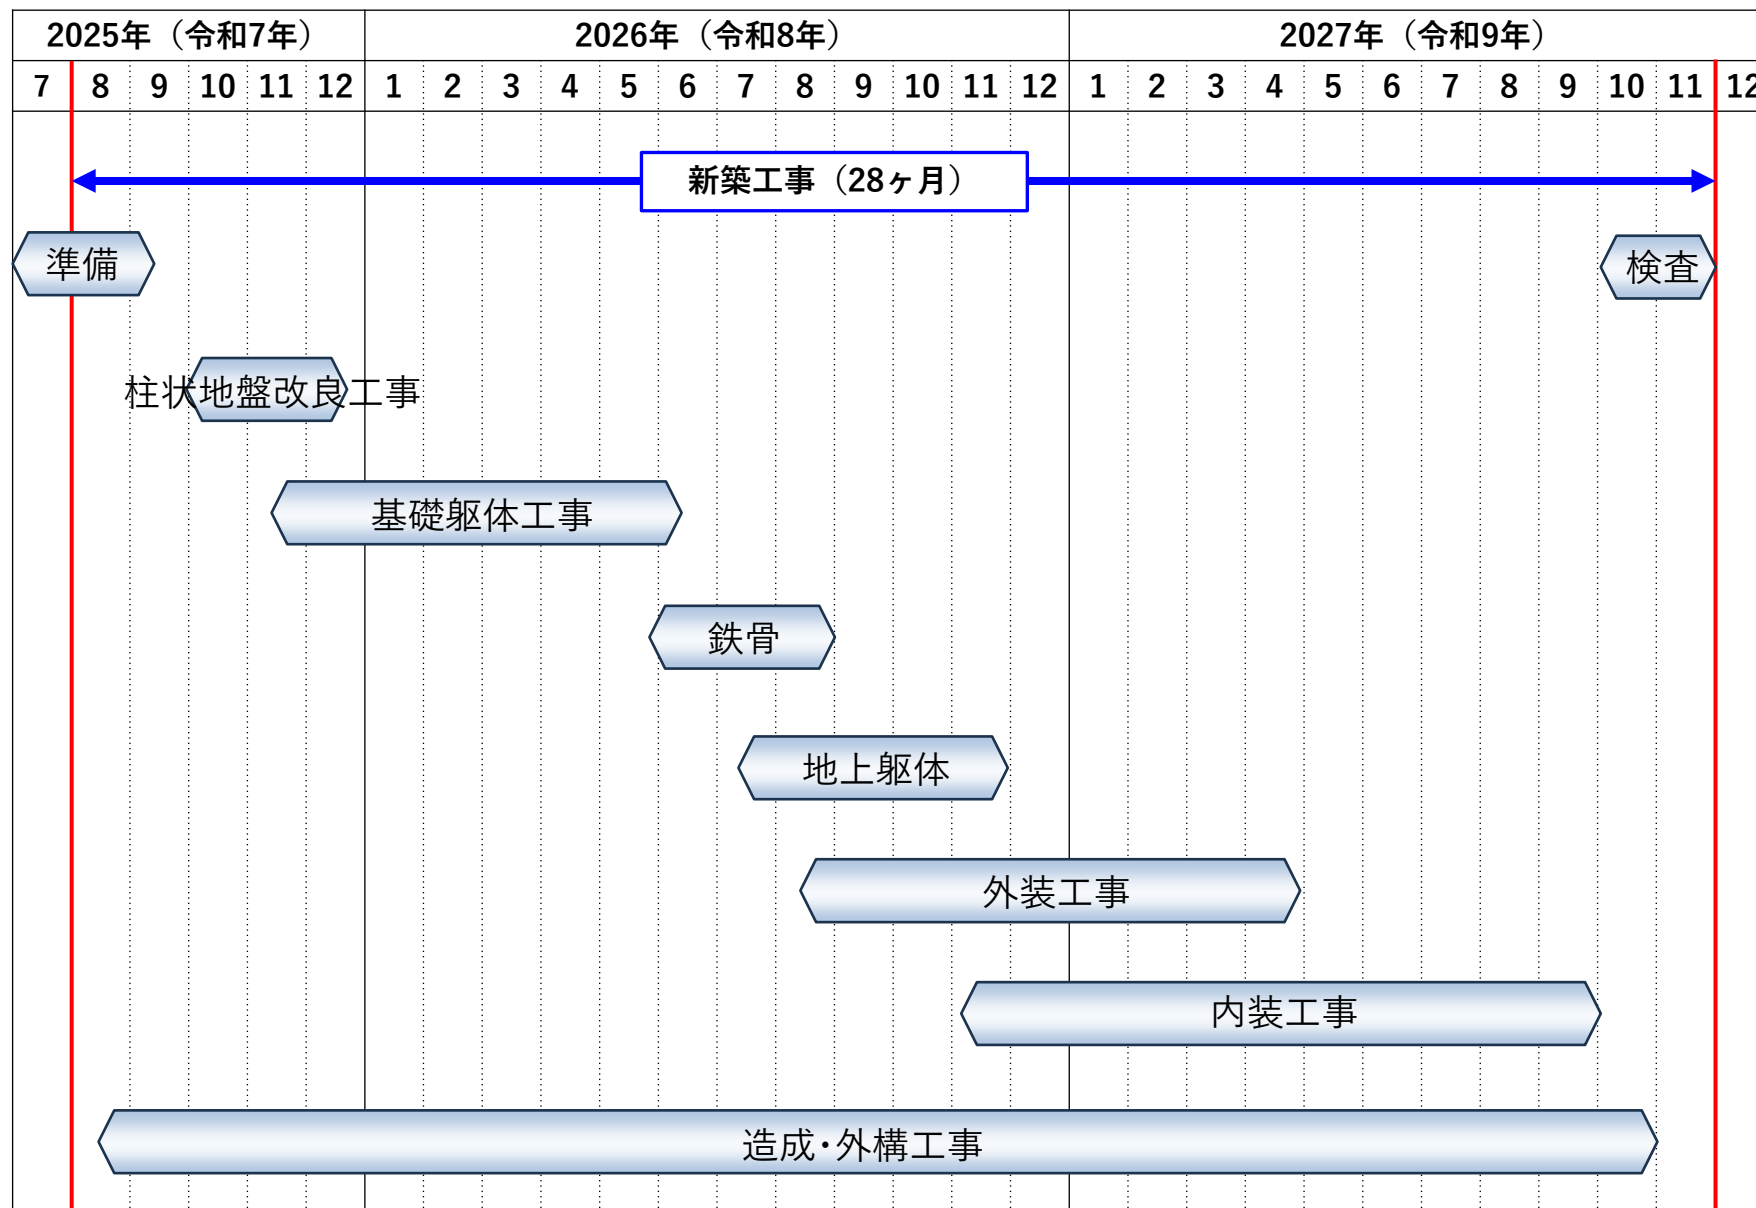

工事車両ルート図



交通誘導員を配置

- 車両出入口には、交通誘導員を常駐配置し、一般車両・歩行者を優先して、交通災害及び第三者災害防止のための確な誘導を徹底します。

盛土や生コン打設、鉄骨搬入等の車両台数が多い時期は、臨時で増員します。



交通誘導員による誘導例


清掃活動の実施

- 計画敷地周辺は定期的に清掃活動を行い、環境美化に配慮します。



清掃活動例

仮設計画図（全体）

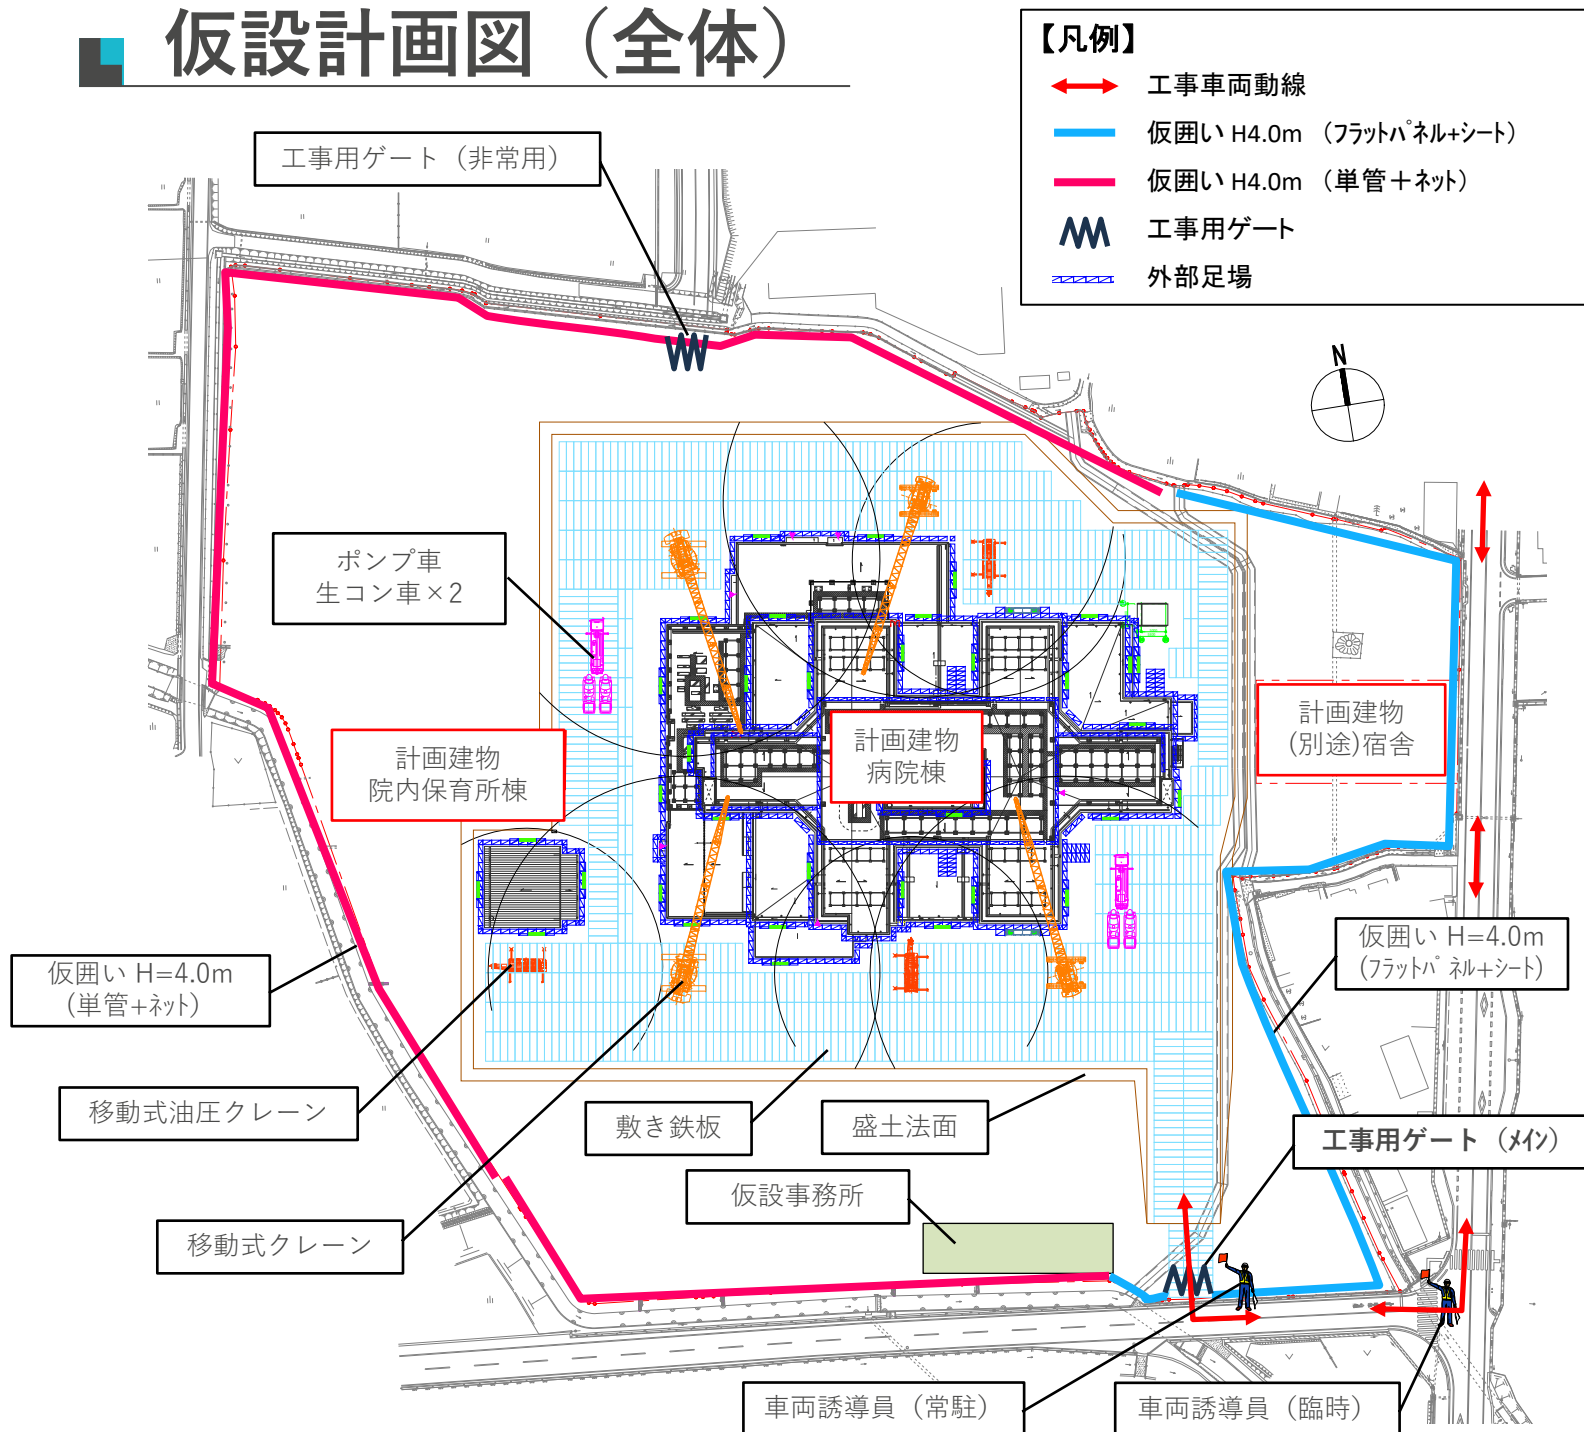


◆仮囲い◆

計画地との境界には仮囲いを設置し、第三者の誤侵入と資材の飛散を防止します。

また、仮囲いにデジタルサイネージを設置し、週間工事予定のお知らせをします。



フラットパネル+シート（例）

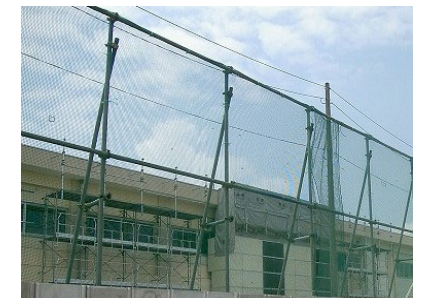

単管+ネット（例）



デジタルサイネージ（例）

■ 仮設計画図（全体）

◆工事用ゲート◆

工事車両出入口には工事用ゲートを設置し、原則南側のメインゲートより入退場を行います。



工事用ゲート（例）

◆工事用道路◆

工事用道路（工事車両・クレーン走行路）は砂埃対策と地盤強度確保として、敷鉄板を敷設します。



敷鉄板（例）

◆移動式クレーン◆

基礎躯体工事中から外装仕上げ工事において、移動式クレーンを使用して資材を揚重します。



移動式油圧クレーン（例）

◆外部足場養生◆

建物外周部には外部足場を組み立て、その外周部にはメッシュシートまたは垂直ネットを張ることで周囲への飛来・落下、飛散および墜落災害を防止します。



メッシュシート養生（例）

◆タイヤ洗浄◆

周辺道路に工事エリアの泥などを持ち出さないよう、工事車両出入口付近にはタイヤ洗浄設備を設置し、状況に応じて工事車両のタイヤ洗浄を実施します。



タイヤ洗浄設備（例）

◆散水養生◆


土工事や外構工事において砂埃が発生する作業時は適宜散水し、周囲への埃の飛散を防止します。



散水実施（例）



移動式クレーン（例）

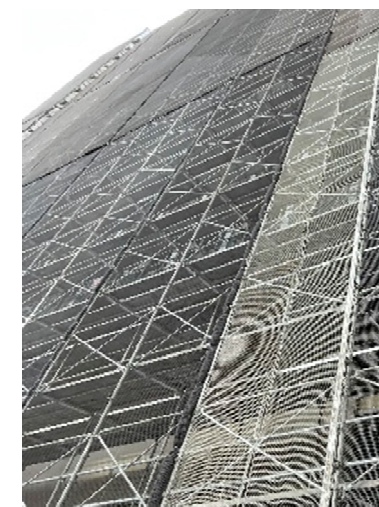

垂直ネット養生（例）
